

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 1 de 19

Fecha de emisión: 22/09/2026 **Próxima revisión:** Pendiente **Proceso dueño:** Gestión de Terceros Contratistas

1. Objetivo

Establecer la metodología para que el tercero contratista registre el alcance y el procedimiento operativo de su proyecto y el análisis de riesgos (IPERC) de cada paso de la actividad, y para que el coordinador de seguridad los valide, apruebe y dé seguimiento al Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), asegurando que los riesgos del trabajo de alto riesgo estén identificados, evaluados y controlados antes de su ejecución.

2. Alcance

Este procedimiento cubre el registro y la validación del alcance, la generación y el análisis de la matriz IPERC, y la generación y validación del AST.

Inicia: El tercero contratista ingresa al formulario de Alcance / Procedimiento Operativo de un proyecto aprobado.

Termina: El coordinador de seguridad valida el AST.

Aplica a: Terceros contratistas con proyectos de trabajo de alto riesgo no rutinario registrados en la plataforma; coordinadores de seguridad de las plantas y unidades operativas de KOF; equipo de TI de Entersys.

3. Referencias

Documento	Descripción o apartado aplicable
PR-KOF-002	Procedimiento Documentación General y Alta de Proyecto (Búsqueda de Proyectos por OC y RFC).
PR-KOF-003	Procedimiento Listado de Personal, Asociación de Colaboradores y Credencialización.
Portal de Gestión de Contratistas	https://entersys.mx/Gestion_Contratistas.html
Módulo de Capacitación / Soporte Técnico	Material de apoyo “Análisis de Riesgos IPERC”: manual y video “Matriz IPERC”.
FAQs Técnicos KOF – IPERC y AST	Preguntas frecuentes para coordinadores de seguridad.
Lineamientos FEMSA de Seguridad	Requisitos de seguridad para trabajos de alto riesgo.

4. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
Alcance / Procedimiento Operativo	Descripción detallada de lo que se hará en el proyecto: objetivos, alcance, equipos y materiales, actividad principal, pasos de la actividad, procedimiento operativo y evidencia fotográfica.
Actividad principal	Trabajo general del proyecto bajo el cual se registran sus pasos (por ejemplo, “Cimentación de zapatas”).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 2 de 19

Término	Definición
Pasos de la actividad	Descripción lógica y secuencial de cada tarea a ejecutar; cada paso se convierte en un renglón de la matriz IPERC.
IPERC	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles.
AST	Análisis de Seguridad en el Trabajo, generado automáticamente a partir de la IPERC aprobada.
Probabilidad, exposición y consecuencia	Criterios con los que se evalúa el riesgo de cada paso, antes y después de aplicar los controles.
Reducción de riesgo	Diferencia entre el riesgo evaluado sin controles y con controles. Si en promedio no hay reducción, el sistema bloquea el proceso.
Controles	Medidas para disminuir el riesgo de cada paso, por ejemplo administrativas o de equipo de protección personal.
Candadeo del proceso	Bloqueo del sistema cuando una etapa previa no está aprobada.
Estatus Pendiente	Estado que impide la visualización o generación de las etapas posteriores.
Aprobación de seguridad	Campo donde el coordinador registra la validación del alcance, de cada paso de la IPERC y del AST.
Coordinador de seguridad	Responsable de seguridad de la unidad operativa de KOF. En algunas áreas se le denomina técnico de seguridad.
OC / RFC / UO / EPP	Orden de compra / Registro Federal de Contribuyentes / Unidad operativa / Equipo de protección personal.

5. Responsabilidades

Puesto	Responsabilidad
Dueño del proceso	Asegurar que este procedimiento se cumpla, se mantenga actualizado y se mida su desempeño.
Tercero contratista	Registrar el alcance, la actividad principal, los pasos, el procedimiento operativo y las fotografías; completar el análisis de riesgos de cada paso en la IPERC y asignar a los colaboradores responsables; atender las correcciones.
Coordinador de seguridad	Revisar y aprobar el alcance o solicitar correcciones; revisar, ajustar y aprobar cada paso de la IPERC; revisar el AST y registrarlo como "Ejecutada - OK"; dar seguimiento a proyectos con IPERC o AST bloqueados o pendientes.
Equipo de TI Entersys	Mantener la plataforma, la generación automática de la IPERC y del AST, la validación de competencias y el bloqueo por falta de reducción de riesgo.

	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 3 de 19

6. Políticas o lineamientos

- Primero se registra el formulario de Alcance; las actividades de la IPERC no se registran antes de ese formulario.
- Siempre se registra primero la actividad principal y después sus pasos, en orden lógico y secuencial. Cada paso se evalúa en la IPERC.
- Los campos obligatorios se identifican con un asterisco rojo (*). Si alguno queda pendiente, el sistema no permite guardar.
- El alcance debe incluir fotografías del sitio o de las tareas, requisito de KOF. Lo ideal es que el contratista haga una visita previa al sitio; cuando no sea posible, se recomienda que el coordinador de seguridad tome las fotografías, las comparta con el contratista y acuerden cómo se hará el trabajo.
- El procedimiento operativo se adjunta en formato libre mientras KOF no defina un formato específico.
- Para modificar el alcance, el contratista selecciona el registro en “Alcance del Proyecto – Terceros” y edita objetivos, alcance, equipos y materiales en el panel de detalles. Las actividades y sus riesgos se modifican o agregan desde el Informe Matriz IPERC (panel de detalles o botón “Nuevo”).
- El alcance aprobado es requisito para la IPERC, y la IPERC aprobada es requisito para el AST (candaneo del proceso).
- El estándar indica que el análisis de riesgos debe hacerse en conjunto por el responsable del área, el de seguridad y el contratista. Actualmente lo registra el contratista y lo valida el coordinador de seguridad.
- En cada paso se deben definir controles específicos y reevaluar el riesgo considerando esos controles. Si en promedio no hay reducción de riesgo, el sistema bloquea el proceso aunque el coordinador haya aprobado los pasos.
- Cada paso debe tener asignados a los colaboradores responsables. El sistema valida automáticamente si cuentan con las competencias y la documentación requeridas para el tipo de actividad.
- Hay una IPERC por proyecto. El análisis se actualiza cuando haya cambios en las actividades.
- La plataforma avanza cuando el coordinador aprueba; es responsabilidad del coordinador verificar que la información aprobada sea correcta.
- El AST solo lo ve y edita el coordinador de seguridad; el contratista no tiene acceso a él.
- Después de cada cambio se debe guardar.

7. Descripción de actividades

Las actividades se describen en orden. El diagrama de flujo se incluye en el Anexo A, los campos de la matriz IPERC en el Anexo B y las pantallas de cada paso en el Anexo C.

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
1	Ingresar al formulario de Alcance.	Tercero contratista	Hay dos rutas. Desde el enlace que comparte el coordinador (https://entersys.mx/Gestion_Contratistas.html): “Requisitos de Trabajos de Alto Riesgo” → “Alcance, Desarrollo, Herramientas & Equipos y Procedimiento Operativo”. Desde el Módulo de Terceros: sección “Alcance / Procedimiento Operativo” → “Formulario de registro de Alcance / Procedimiento”.

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 4 de 19

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
2	Capturar los datos del alcance.	Tercero contratista	El contratista registra la OC, el RFC, el lugar o equipo específico donde se hará el trabajo, la fecha de registro, los objetivos, el alcance y los equipos y materiales.
3	Registrar la actividad principal y los pasos de la actividad.	Tercero contratista	El contratista registra primero la actividad principal y después cada paso de forma lógica y secuencial, con su título y su descripción. Por ejemplo, para la actividad principal “Cimentación de zapatas”: acordonamiento con malla, retiro de lámina, trazo de zapatas y demolición de pavimento.
4	Adjuntar el procedimiento operativo y las fotografías, y enviar.	Tercero contratista	El contratista adjunta el procedimiento operativo (formato libre) y las fotografías del sitio o de las tareas. Revisa la información y envía el formulario.
5	Generar la matriz IPERC.	Sistema (plataforma)	Al enviar el alcance, el sistema genera automáticamente un renglón de la matriz IPERC por cada paso registrado. Los pasos pueden tardar unos minutos en aparecer; hay que actualizar la página.
6	Localizar el proyecto y entrar a “Alcance y Desarrollo”.	Coordinador de seguridad	En su módulo, en “Trabajos en Alto Riesgo”, el coordinador busca el proyecto en “Búsqueda de Proyectos” con la OC y el RFC (PR-KOF-002) y entra a la sección “Alcance y Desarrollo” del menú izquierdo.
7	Revisar el alcance y el paso a paso.	Coordinador de seguridad	En “Desarrollo de Actividades” el coordinador revisa que el paso a paso esté completo y sea coherente con el tipo de trabajo y el área de ejecución. En “Aprobación de Alcance” revisa los objetivos, el alcance, los equipos y materiales, el procedimiento operativo y la evidencia fotográfica adjunta.
8	¿El alcance está completo y es correcto? Sí → paso 10 / No → paso 9.	Coordinador de seguridad	El alcance debe estar visible en la plataforma, completo y coherente con el proyecto.
9	Solicitar correcciones.	Coordinador de seguridad / Tercero contratista	En “Aprobación de Alcance”, el coordinador registra las correcciones en “Comentarios usuario seguridad KOF” y guarda, sin aprobar el alcance. El contratista selecciona su registro en “Alcance del Proyecto – Terceros”, corrige en el panel de detalles y guarda; los pasos los corrige en el Informe Matriz IPERC. El coordinador regresa al paso 7.
10	Aprobar el alcance.	Coordinador de seguridad	En “Aprobación de Alcance”, el coordinador selecciona “Aprobado” en “Aprobación seguridad” y guarda. Con el alcance aprobado se habilita la validación de la IPERC.
11	Ingresar al Informe Matriz IPERC.	Tercero contratista	En el Módulo de Terceros, el contratista entra a “Informe Matriz IPERC – Contratista” (Registro IPERC – Contratistas) y filtra por su proyecto.

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 5 de 19

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
12	Completar el análisis de riesgos de cada paso y asignar al personal.	Tercero contratista	El contratista selecciona cada paso y, en el panel de detalles, registra la clasificación del trabajo a ejecutar, las fechas de inicio y término, la clasificación del peligro, el peligro asociado, el riesgo y su consecuencia, y evalúa probabilidad, exposición y consecuencia. Después define los controles y vuelve a evaluar probabilidad, exposición y consecuencia considerando esos controles. Asigna a los colaboradores responsables del paso y guarda (Anexo B).
13	Validar competencias y reducción de riesgo.	Sistema (plataforma)	El sistema marca en rojo fuerte al colaborador que no está registrado en el Listado de Personal ni asociado al proyecto, y en rojo claro al que está registrado pero no cumple los requisitos del trabajo (por ejemplo, sus DC-3); el informe de responsables indica para qué trabajos sí tiene competencias. Si en promedio no hay reducción de riesgo, el sistema bloquea el proceso.
14	Entrar a “Matriz IPERC”.	Coordinador de seguridad	Con el alcance aprobado, el coordinador entra a la sección “Matriz IPERC” del menú izquierdo y abre la liga “Informe IPERC” (Registro Matriz IPERC).
15	Revisar cada paso del análisis.	Coordinador de seguridad	El coordinador revisa en cada paso los peligros, los riesgos, los controles, la reevaluación con controles, la reducción de riesgo y la asignación de colaboradores.
16	¿El análisis es correcto y reduce el riesgo? Sí → paso 18 / No → paso 17.	Coordinador de seguridad	Un análisis con índice de riesgo bajo en todos los pasos de un trabajo de alto riesgo, sin reducción después de los controles o con colaboradores en rojo no es correcto.
17	Corregir el análisis.	Coordinador de seguridad / Tercero contratista	El contratista puede modificar toda la información del paso excepto la aprobación de seguridad; el coordinador también puede modificarla. Una vez corregido, el coordinador regresa al paso 15.
18	Aprobar cada paso y guardar.	Coordinador de seguridad	El coordinador aprueba cada paso de la actividad en “Aprobación de seguridad” y guarda los cambios.
19	Generar el AST.	Sistema (plataforma)	En cuanto el coordinador aprueba todos los pasos de la IPERC, el sistema genera automáticamente el AST. Solo el coordinador de seguridad lo ve; el contratista no tiene acceso a él.
20	Revisar el AST.	Coordinador de seguridad	El coordinador entra a la sección “AST” del menú izquierdo, abre la liga “Informe de AST” y revisa la información que proviene de la IPERC: actividad principal, peligro asociado, riesgo, descripción de los controles, fecha programada, clasificación del trabajo y responsables. Desde esa sección también puede usar “Descarga de AST”.

	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 6 de 19

No.	Actividad	Responsable	Desarrollo de la actividad
21	Registrar el AST como "Ejecutada - Ok" y guardar.	Coordinador de seguridad	En el panel de detalles de cada registro del AST, el coordinador selecciona "Ejecutada - Ok" en "Aprobación Seguridad" y guarda.
22	Fin del procedimiento.	Coordinador de seguridad	El proyecto cuenta con alcance, IPERC y AST validados y continúa con el plan de rescate y las siguientes etapas.

8. Control de registros

Registro	Código	Responsable	Ubicación / medio
Alcance del proyecto (datos, actividad principal, pasos, procedimiento operativo y fotografías)	FO-KOF-004-01	Tercero contratista	Smartsheet: Alcance del Proyecto – Terceros / Desarrollo de Actividades
Aprobación de alcance y comentarios	FO-KOF-004-02	Coordinador de seguridad	Smartsheet: Aprobación de Alcance
Matriz IPERC (análisis por paso, personal asignado y aprobación)	FO-KOF-004-03	Tercero contratista / Coordinador de seguridad	Smartsheet: Registro IPERC – Contratistas / Registro Matriz IPERC
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)	FO-KOF-004-04	Coordinador de seguridad	Smartsheet: Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

9. Riesgos y controles (si aplica)

Riesgo	Control / acción	Responsable
Procedimiento incompleto: faltan pasos.	El coordinador revisa el paso a paso antes de aprobar y solicita correcciones.	Coordinador de seguridad
Formulario de Alcance no registrado.	Enviar nuevamente el formulario.	Tercero contratista
Actividades no visibles en la IPERC.	Esperar unos minutos y actualizar la página.	Tercero contratista
Registrar actividades antes del formulario de Alcance.	La política exige registrar primero el Alcance.	Tercero contratista
Cambios no guardados o que no se pueden guardar.	Confirmar los cambios con "Guardar" y completar los campos con asterisco rojo (*).	Tercero contratista / Coordinador de seguridad

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 7 de 19

Riesgo	Control / acción	Responsable
Análisis de riesgos mal hecho (por ejemplo, todo evaluado como muy bajo).	El sistema bloquea si no hay reducción de riesgo; el coordinador revisa cada paso antes de aprobar.	Coordinador de seguridad
El contratista es juez y parte al analizar los riesgos de su propio trabajo.	El coordinador de seguridad valida cada paso.	Coordinador de seguridad
Asignar a un colaborador no registrado o sin las competencias requeridas.	El sistema marca al colaborador en rojo según el caso.	Equipo de TI Entersys
El coordinador aprueba información incorrecta y el proceso avanza.	Es responsabilidad del coordinador verificar el contenido antes de aprobar.	Coordinador de seguridad
La IPERC o el AST no se visualizan.	Verificar que el alcance esté cargado y aprobado y que no haya etapas previas pendientes; dar seguimiento hasta su habilitación.	Coordinador de seguridad

10. Anexos

Anexo	Descripción	Código
A	Diagrama de flujo del procedimiento	AN-KOF-004-A
B	Campos de la matriz IPERC	AN-KOF-004-B
C	Pantallas del proceso	AN-KOF-004-C

11. Control de cambios


Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Solicitó / aprobó
00	22/09/2026	Emisión inicial del documento.	Líder del Sistema de Gestión de Calidad, Entersys

12. Autorización

Elaboró	Revisó	Aprobó
Itzel Cornejo SDR, Entersys 22/09/2026	Juan Carlos Bejerano Líder del Sistema de Gestión de Calidad, Entersys 23/09/26	Jorge Alejandro Hinojosa Chavez Líder de Desarrollo, Entersys 23/09/26

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 8 de 19

Anexo A. Diagrama de flujo del procedimiento

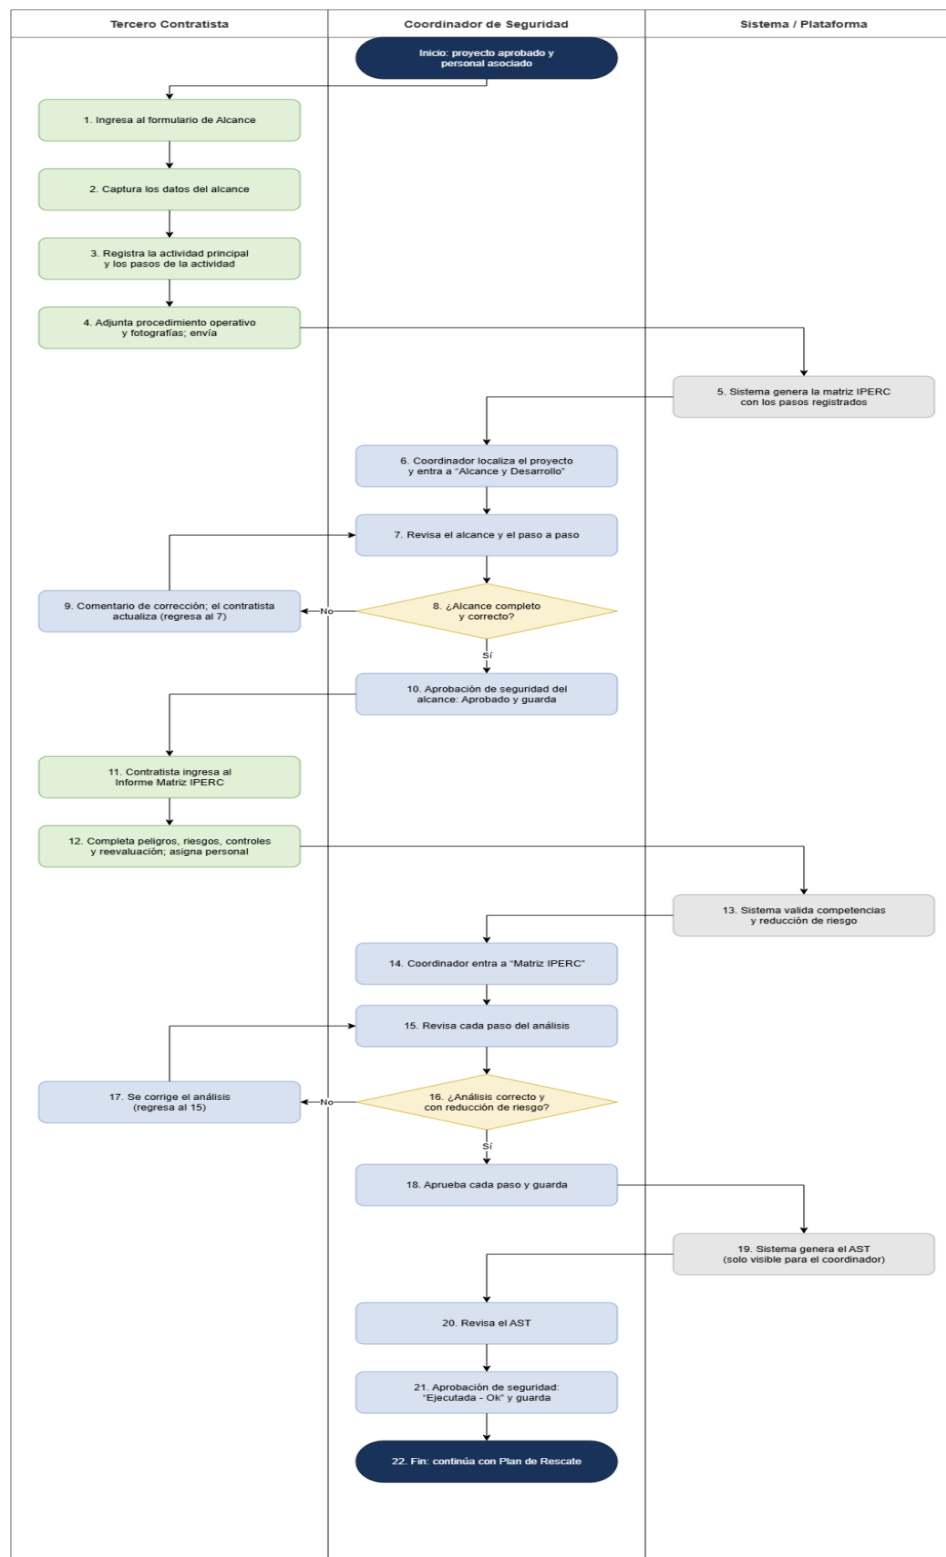

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 9 de 19

Anexo B. Campos de la matriz IPERC

Información que se registra por cada paso de la actividad en el panel de detalles del Informe Matriz IPERC:

Campo	Descripción
Actividad principal y pasos de la actividad	Proviene del formulario de Alcance.
Lugar o equipo específico	Dónde se ejecutará el paso.
Clasificación del trabajo a ejecutar	Tipo de trabajo del paso, por ejemplo trabajos en alturas, trabajos en caliente, seguridad eléctrica o manejo de herramientas de poder.
Fecha de inicio y fecha de término	Programación del paso.
Clasificación del peligro y peligro asociado	Por ejemplo, físico; mecánicos – condiciones de equipos y herramientas.
Riesgo y consecuencia del riesgo	Por ejemplo, caída, lesión o fractura.
Probabilidad, exposición y consecuencia	Evaluación del riesgo sin controles.
Criterios de control	Controles a implementar, por ejemplo administrativos o de EPP.
Probabilidad, exposición y consecuencia con controles	Reevaluación del riesgo considerando los controles; debe reflejar una reducción.
Colaboradores asignados	Responsables de ejecutar el paso; el sistema valida sus competencias y documentación.
Aprobación de seguridad	Validación del coordinador de seguridad; el contratista no puede modificarla.

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 10 de 19

Anexo C. Pantallas del proceso

Tercero contratista – Registro del Alcance

Este portal está diseñado para facilitar la entrega, revisión y aprobación de documentación para garantizar el cumplimiento del Estándar Global de Seguridad para Terceros & Contratistas.

"Alta de Contratista":

Utilízalo para cargar los documentos generales obligatorios, como pólizas de seguro, la declaración jurada de cumplimiento de requisitos de seguridad, y el listado del personal y sus competencias.

"Requisitos de Trabajos de Alto Riesgo":

Aquí podrás registrar toda la documentación específica, los procedimientos de seguridad, los permisos requeridos y los planes de rescate necesarios para trabajos de alto riesgo.

"Ticket de ayuda a soporte Entersys":

Si experimentas retrasos en tu proyecto debido a autorizaciones pendientes, utiliza este formulario para notificarlo. Esto nos permitirá identificar acciones que aceleren el proceso de autorización y, con ello, la ejecución de tu proyecto.

"Flujo de proceso de Trabajos de Alto Riesgo":

Consulta el diagrama de flujo completo del proceso para trabajos de alto riesgo, donde podrás visualizar cada etapa, los responsables y los tiempos estimados para cada fase del proceso de autorización.

Nuestro objetivo es asegurar que todos los trabajos cumplan con los requisitos de seguridad establecidos, protegiendo la integridad de las operaciones y promoviendo un entorno laboral seguro y eficiente.

Alta de Contratista

Requisitos de Trabajos de Alto Riesgo

Ticket de ayuda a soporte Entersys

Flujo de proceso de Trabajos de Alto Riesgo

C.1 Ruta 1: "Requisitos de Trabajos de Alto Riesgo" en el Portal de Gestión de Contratistas (paso 1).

Portal de Contratistas
[Página Principal](#)
[Plan de rescate](#)

Alcance, desarrollo, Herramientas & Equipos y procedimiento operativo

[Carga de permisos](#)

Portal de Gestión de Contratistas de Alto Riesgo

Alcance, desarrollo, Herramientas & Equipos y procedimiento operativo



Alcance del Proyecto


Instrucciones para el Contratista:

A continuación, se le solicita que detalle el proceso de desarrollo y alcance del proyecto. Este formulario debe incluir:


- Paso a Paso de las Actividades:** Describa cada actividad necesaria para completar el proyecto, siguiendo el orden lógico de ejecución.
 - a. **Nombre de la Actividad:** Proporcione un nombre breve y descriptivo para cada actividad.
 - b. **Descripción de la Actividad:** Escriba una descripción detallada que explique en qué consiste la actividad.

C.2 Ruta 1: formulario "Alcance, desarrollo, Herramientas & Equipos y procedimiento operativo" (paso 1).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 11 de 19

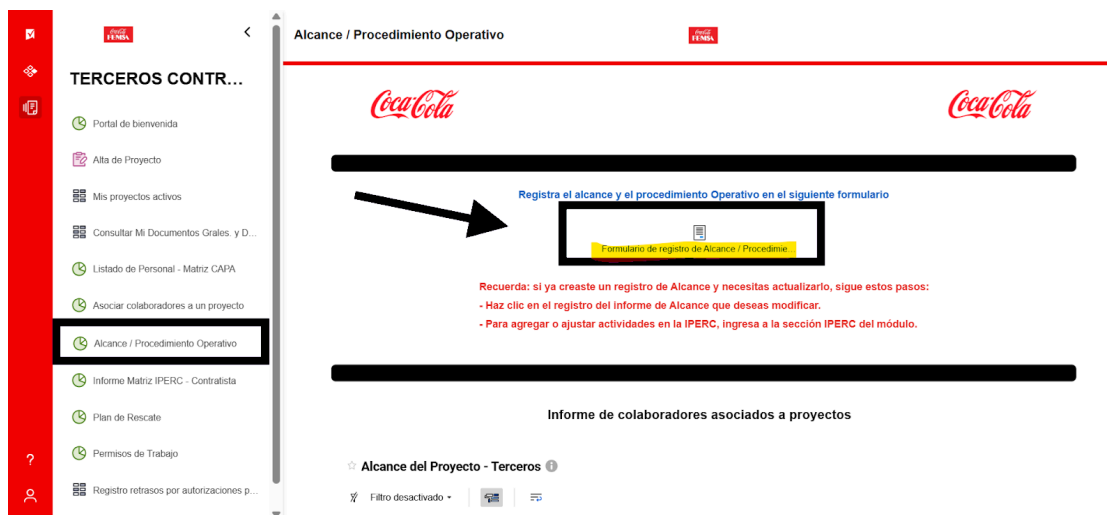

C.3 Ruta 2: sección “Alcance / Procedimiento Operativo” del Módulo de Terceros y liga al formulario (paso 1).



Alcance del Proyecto

Instrucciones para el Contratista:

A continuación, se le solicita que detalle el proceso de desarrollo y alcance del proyecto. Este formulario debe incluir:

- Paso a Paso de las Actividades: Describa cada actividad necesaria para completar el proyecto, siguiendo el orden lógico de ejecución.
 - a. Nombre de la Actividad: Proporcione un nombre breve y descriptivo para cada actividad.
 - b. Descripción de la Actividad: Escriba una descripción detallada que explique en qué consiste la actividad.
 - c. Clasificación de la Actividad: Indique si la actividad es Rutinaria (que forma parte de las actividades regulares) o No Rutinaria (actividad específica para este proyecto).
- Evidencia Fotográfica o Imágenes: Adjunte fotos o imágenes que documenten cada etapa o paso del proceso. Estas evidencias ayudarán a validar el desarrollo y cumplimiento de cada actividad.


Este formulario tiene como objetivo garantizar la claridad y trazabilidad de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto para el llenado del IPERC.

IMPORTANTE:

- Solo debe cargar un registro de Alcance por proyecto

C.4 Formulario “Alcance del Proyecto” con las instrucciones para el contratista (pasos 2 a 4).

	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 12 de 19

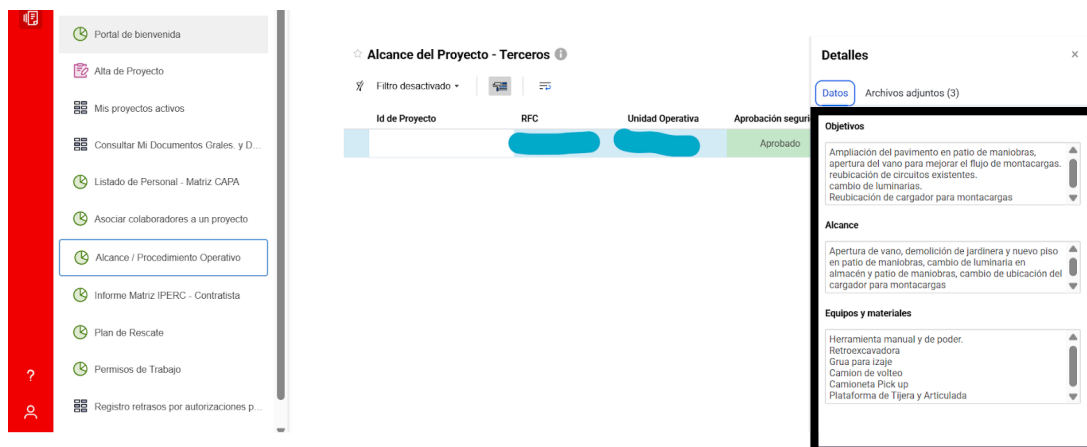


C.5 Modificación del alcance: registro en “Alcance del Proyecto – Terceros” y panel de detalles (paso 9).

Coordinador de seguridad – Validación del Alcance



C.6 “Trabajos en Alto Riesgo” en el módulo del coordinador (paso 6).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 13 de 19

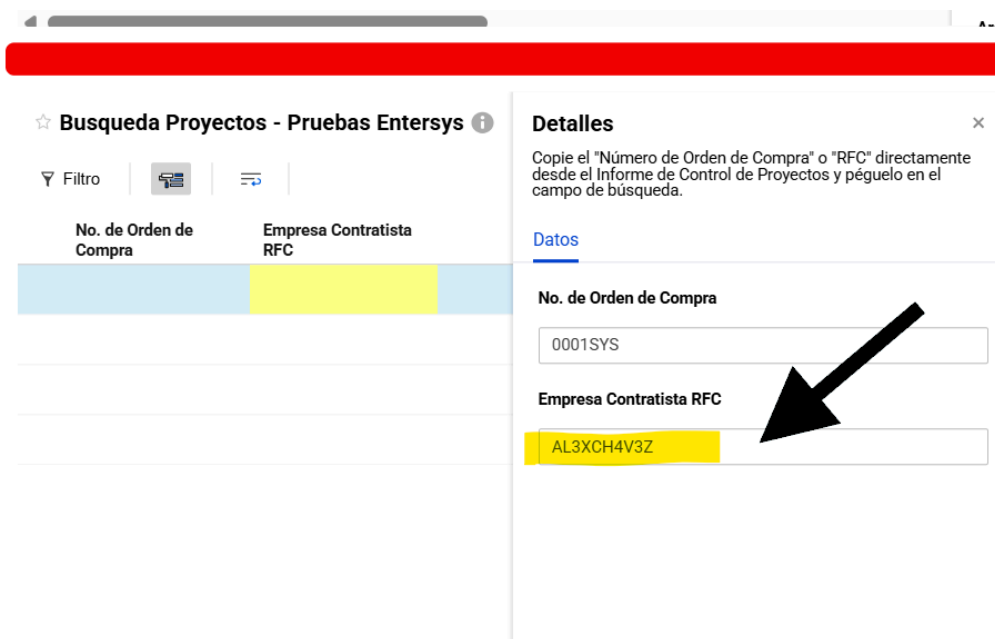

☆ **Busqueda Proyectos - Pruebas Entersys** ⓘ

▼ Filtro

No. de Orden de Compra	Empresa Contratista RFC

Detalles ✕

Copie el "Número de Orden de Compra" o "RFC" directamente desde el Informe de Control de Proyectos y péguelo en el campo de búsqueda.

Datos

No. de Orden de Compra

0001SYS

Empresa Contratista RFC

AL3XCH4V3Z

C.7 Búsqueda del proyecto por OC y RFC (paso 6).



Replicas de zonas - SCC Starter Program > Project list > DEMO - Pruebas Entersys > Alcance y Desarrollo

Alcance y Desarrollo

Nombre

Zona

R.Region

UO Prueba Entersys

Unidad Operativa

Alcance Trabajos en Alturas

Empresa contratista

Prueba Entersys

CEDHS / Planta

UO Prueba Entersys

Area (Lay Out.Ruta)

Acceso a Unidad Operativa

Proyecto

Seguridad Eléctrica

Trabajos en Alturas en el area denominada

Todas las areas

Nivel de Riesgo

Alto

Altura de Trabajo

Superficies de trabajo


Sistemas de protección

Otros Trabajos de Alto Riesgo


Numero de personas y Coordinación de Trabajos

Sistemas de Acceso

C.8 Sección "Alcance y Desarrollo" (paso 6).

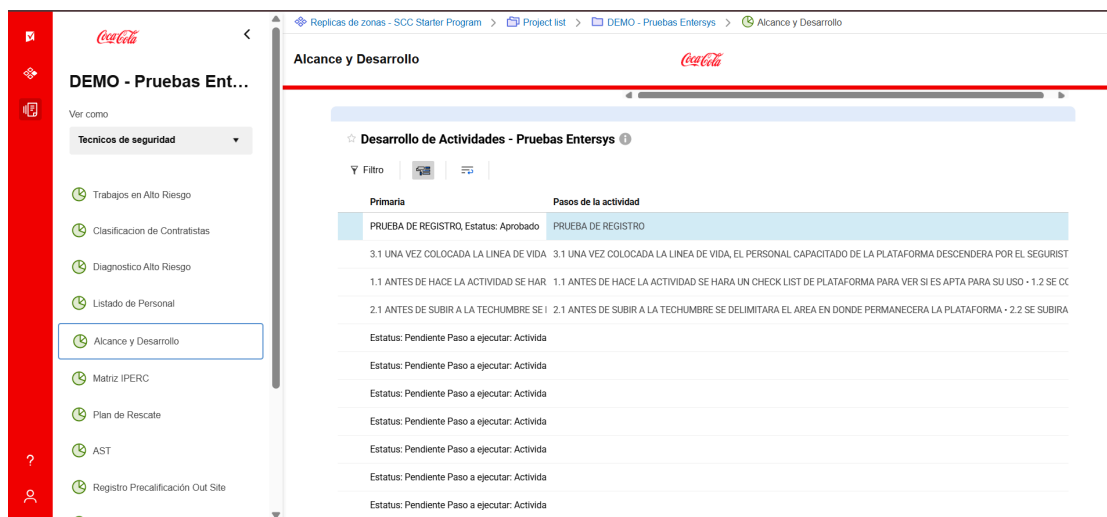


C.9 “Desarrollo de Actividades”: paso a paso registrado (paso 7).

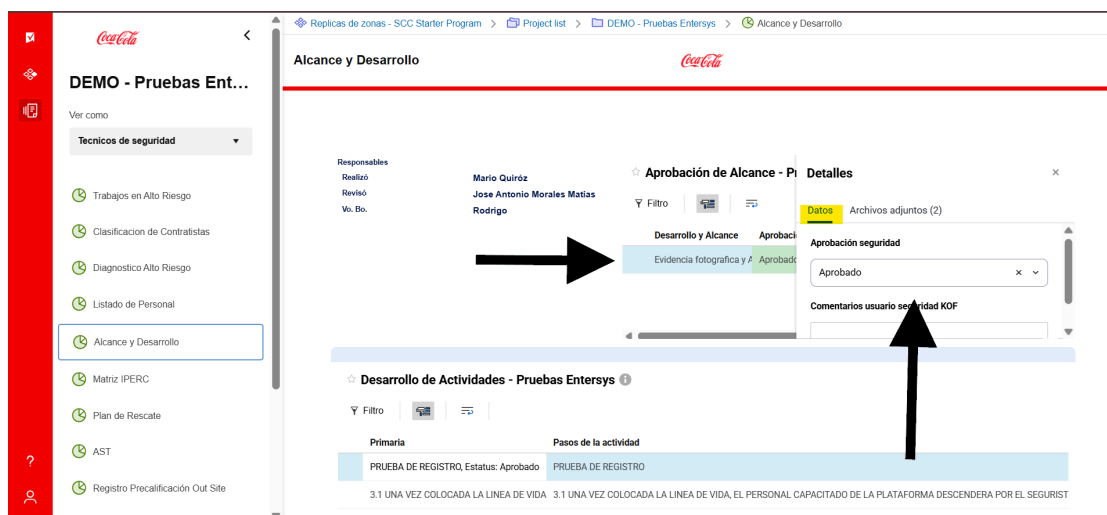

C.10 “Aprobación de Alcance”: aprobación de seguridad y comentarios (pasos 9 y 10).

Tercero contratista – Análisis de riesgos (IPERC)

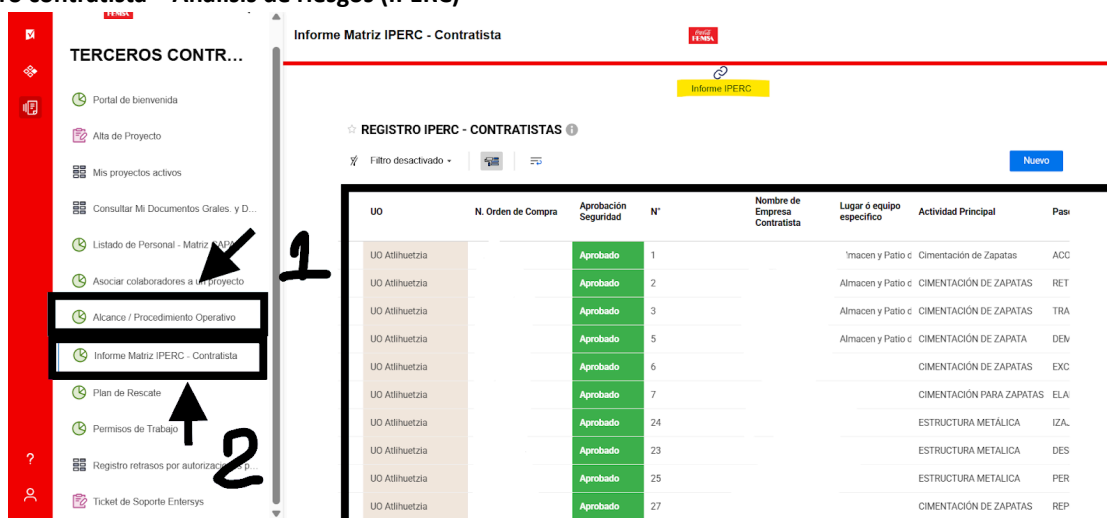


Informe Matriz IPERC - Contratista

REGISTRO IPERC - CONTRATISTAS

Filtro desactivado

UO	N. Orden de Compra	Aprobación Seguridad	N°	Nombre de Empresa Contratista	Lugar ó equipo específico	Actividad Principal	Paso
UO Atlahuatzia		Aprobado	1		Almacén y Patio c	Cimentación de Zapatas	ACC
UO Atlahuatzia		Aprobado	2		Almacén y Patio c	CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	RET
UO Atlahuatzia		Aprobado	3		Almacén y Patio c	CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	TRA
UO Atlahuatzia		Aprobado	5		Almacén y Patio c	CIMENTACIÓN DE ZAPATA	DEV
UO Atlahuatzia		Aprobado	6			CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	EXC
UO Atlahuatzia		Aprobado	7			CIMENTACIÓN PARA ZAPATAS	ELA
UO Atlahuatzia		Aprobado	24			ESTRUCTURA METÁLICA	IZA.
UO Atlahuatzia		Aprobado	23			ESTRUCTURA METALICA	DES
UO Atlahuatzia		Aprobado	25			ESTRUCTURA METALICA	PER
UO Atlahuatzia		Aprobado	27			CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	REP

C.11 "Informe Matriz IPERC – Contratista" en el Módulo de Terceros (paso 11).

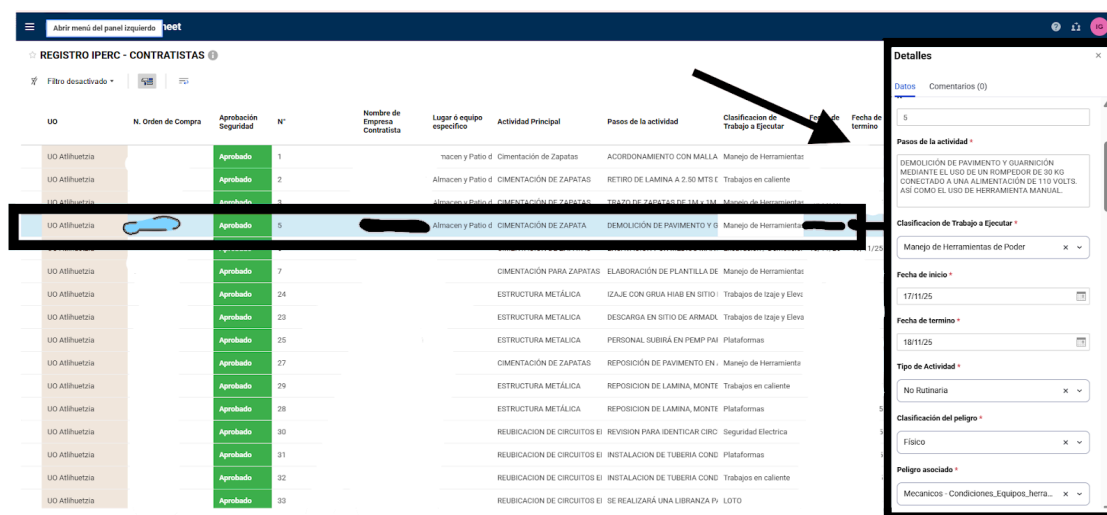

Abrió menú del panel izquierdo

REGISTRO IPERC - CONTRATISTAS

Filtro desactivado

UO	N. Orden de Compra	Aprobación Seguridad	N°	Nombre de Empresa Contratista	Lugar ó equipo específico	Actividad Principal	Pasos de la actividad	Clasificación de Trabajo a Ejecutar	Fecha de término
UO Atlahuatzia		Aprobado	1		Almacén y Patio d	Cimentación de Zapatas	ACORDONAMIENTO CON MALLA	Manejo de Herramientas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	2		Almacén y Patio d	CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	RETIRO DE LAMINA A 2.30 MTS E	Trabajos en caliente	
UO Atlahuatzia		Aprobado	3		Almacén y Patio d	CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	TRATADO DE ZAPATAS DE 14x13M	Manejo de Herramientas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	5		Almacén y Patio d	CIMENTACIÓN DE ZAPATA	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y B	Manejo de Herramientas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	7			CIMENTACIÓN PARA ZAPATAS	ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE	Manejo de Herramientas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	24			ESTRUCTURA METÁLICA	IZAJE CON GRUA HIAB EN SITIO	Trabajos de Izaje y Elev	
UO Atlahuatzia		Aprobado	23			ESTRUCTURA METALICA	DESCARGA EN SITIO DE ARMAD	Trabajos de Izaje y Elev	
UO Atlahuatzia		Aprobado	25			ESTRUCTURA METALICA	PERSONAL SUBIRÁ EN POMP PAI	Plataformas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	27			CIMENTACIÓN DE ZAPATAS	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN	Manejo de Herramientas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	29			ESTRUCTURA METALICA	REPOSICION DE LAMINA, MONTE	Trabajos en caliente	
UO Atlahuatzia		Aprobado	28			ESTRUCTURA METÁLICA	REPOSICION DE LAMINA, MONTE	Plataformas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	30			REUBICACION DE CIRCUITOS EI	REVISION PARA IDENTIFICAR CIRC	Seguridad Electrica	
UO Atlahuatzia		Aprobado	31			REUBICACION DE CIRCUITOS EI	INSTALACION DE TUBERIA COND	Plataformas	
UO Atlahuatzia		Aprobado	32			REUBICACION DE CIRCUITOS EI	INSTALACION DE TUBERIA COND	Trabajos en caliente	
UO Atlahuatzia		Aprobado	33			REUBICACION DE CIRCUITOS EI	SE REALIZARÁ UNA LIBRANZA P	LOTO	

Detalles

Objetivo

Comentarios (0)

Pasos de la actividad

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN MEDIANTE EL USO DE UN ROMPEDOR DE 30 KG CONECTADO A UNA ALIMENTACIÓN DE 110 VOLTS ASÍ COMO EL USO DE HERRAMIENTA MANUAL.

Clasificación de Trabajo a Ejecutar

Manejo de Herramientas de Poder

Fecha de inicio

17/11/25

Fecha de termino

18/11/25

Tipo de Actividad

No Rutinaria

Clasificación del peligro


Físico

Peligro asociado

Mecánicos - Condiciones_Equipos_Herra...

C.12 Selección del paso de la actividad y panel de detalles (paso 12).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
	Página 16 de 19	

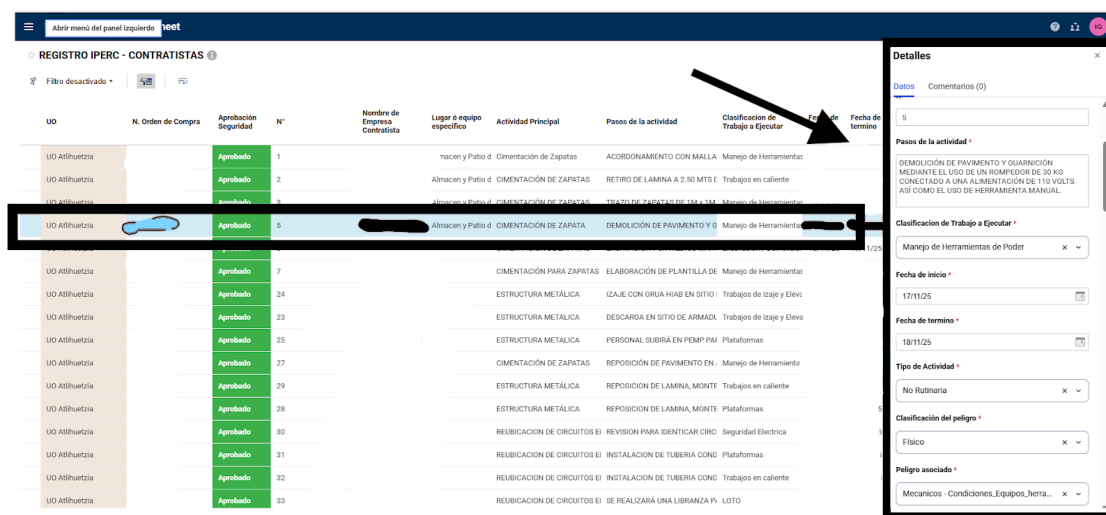


C.13 Campos del análisis en el panel de detalles (paso 12).



C.14 Botón "Nuevo" para agregar actividades (políticas).

Coordinador de seguridad – Validación de la IPERC

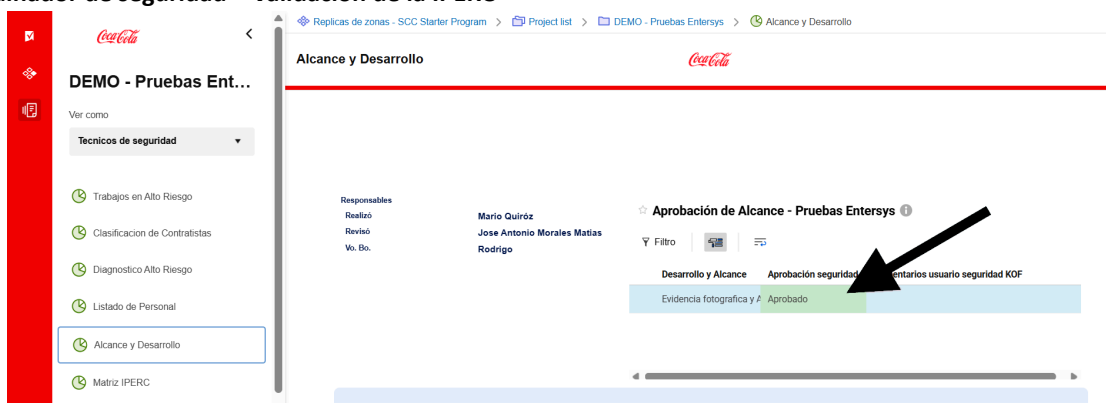

C.15 Confirmación de que el alcance está aprobado (paso 14).



Matriz IPERC

Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles IPERC

Registro IPERC & AST (Versión manual - Excel)


Informe IPERC

Registro Matriz IPERC - Pruebas Entersys

Filtro

Nombre de Empresa Contratista	Lugar ó equipo específico	N°	Actividad Principal	Pasos de la actividad	Clasificación de Trabajo a Ejecutar	Fecha de Inicio
Prueba Entersys		4	pRUEBA DE REGISTRO	PRUEBA DE REGISTRO	Trabajos en Alturas	20/09/25
Prueba Entersys	NA	3	ASCENSO A TODO EL PERSONA	3.1 UNA VEZ COLOCADA LA LINE		
Prueba Entersys	NA	2	TRASLADO DE PLATAFORMA D	1.1 ANTES DE HACER LA ACTIVIDA	Trabajos en Alturas	19/09/25
Prueba Entersys	NA	1	ASCENSO POR PLATAFORMA F	2.1 ANTES DE SUBIR A LA TECHU	Supervisión de seguridad	19/09/25

C.16 Sección “Matriz IPERC” y liga “Informe IPERC” (paso 14).

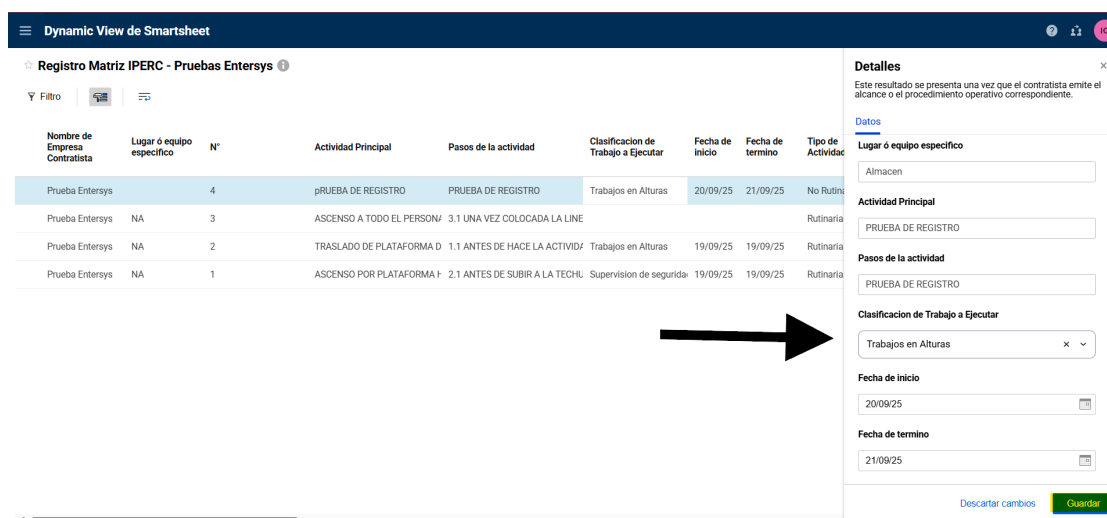

Dynamic View de Smartsheet

Registro Matriz IPERC - Pruebas Entersys

Filtro

Nombre de Empresa Contratista	Lugar ó equipo específico	N°	Actividad Principal	Pasos de la actividad	Clasificación de Trabajo a Ejecutar	Fecha de Inicio	Fecha de término	Tipo de Actividad
Prueba Entersys		4	pRUEBA DE REGISTRO	PRUEBA DE REGISTRO	Trabajos en Alturas	20/09/25	21/09/25	No Rutina
Prueba Entersys	NA	3	ASCENSO A TODO EL PERSONA	3.1 UNA VEZ COLOCADA LA LINE				Rutinaria
Prueba Entersys	NA	2	TRASLADO DE PLATAFORMA D	1.1 ANTES DE HACER LA ACTIVIDA	Trabajos en Alturas	19/09/25	19/09/25	Rutinaria
Prueba Entersys	NA	1	ASCENSO POR PLATAFORMA F	2.1 ANTES DE SUBIR A LA TECHU	Supervisión de seguridad	19/09/25	19/09/25	Rutinaria

Detalles

Este resultado se presenta una vez que el contratista emite el alcance o el procedimiento operativo correspondiente.

Datos

Lugar ó equipo específico

Almacen

Actividad Principal

PRUEBA DE REGISTRO

Pasos de la actividad

PRUEBA DE REGISTRO

Clasificación de Trabajo a Ejecutar

Trabajos en Alturas

Fecha de inicio

20/09/25

Fecha de termino


21/09/25

Descartar cambios Guardar

C.17 Revisión y aprobación de cada paso, y guardado (pasos 15 y 18).

 Coca-Cola FEMSA	PROCEDIMIENTO ALCANCE, PROCEDIMIENTO OPERATIVO, IPERC Y AST	Código: PR-KOF-004
		Revisión: 00
		Página 18 de 19

Coordinador de seguridad – AST

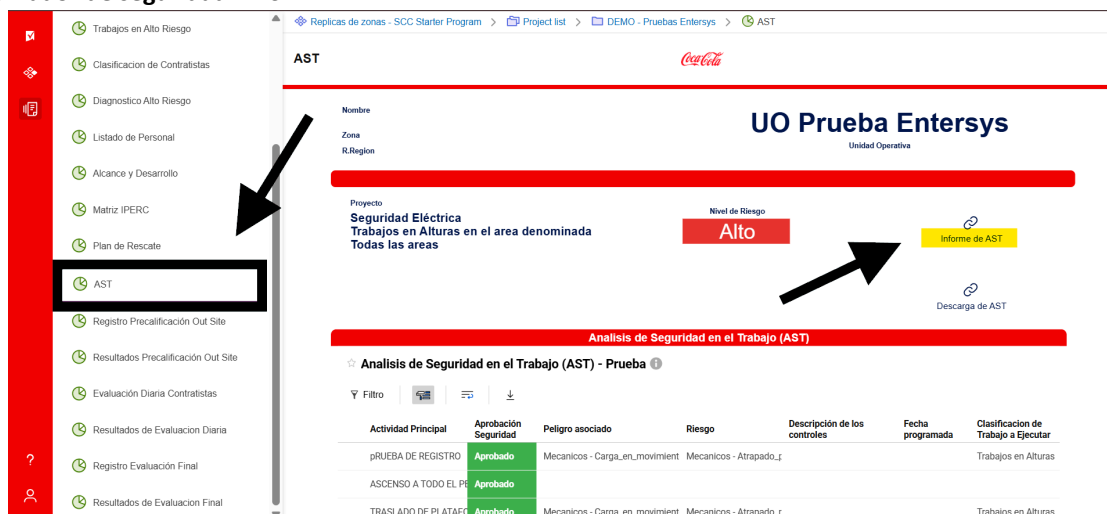

AST

Nombre
Zona
R.Region

UO Prueba Entersys
Unidad Operativa

Proyecto
Seguridad Eléctrica
Trabajos en Alturas en el área denominada
Todas las áreas

Nivel de Riesgo
Alto

Informe de AST
Descarga de AST

Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)

☆ Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) - Prueba ⓘ

Filtro

Actividad Principal	Aprobación Seguridad	Peligro asociado	Riesgo	Descripción de los controles	Fecha programada	Clasificación de Trabajo a Ejecutar
pRUEBA DE REGISTRO	Aprobado	Mecanicos - Carga_en_movimient	Mecanicos - Atrapado_¿			Trabajos en Alturas
ASCENSO A TODO EL PE	Aprobado					
TRASLADO DE PLATAFO	Aprobado	Mecanicos - Carga_en_movimient	Mecanicos - Atrapado_¿			Trabajos en Alturas

C.18 Sección “AST”, liga “Informe de AST” y “Descarga de AST” (paso 20).

Dynamic View de Smartsheet

☆ Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) - Prueba ⓘ

Filtro

Actividad Principal	Aprobación Seguridad	Peligro asociado	Riesgo	Descripción de los controles	Fecha programada	Clasificación de Trabajo a Ejecutar	Responsables	Indicador de No Aptos	Nombre de as
pRUEBA DE REGISTRO	Aprobado	Mecanicos - Carga_en_movimient	Mecanicos - Atrapado_¿			Trabajos en Alturas	Rodrigo Delay- APTO para: Trabajos en Alturas, Mario Dorr	2	Rodrigo Delay
ASCENSO A TODO EL PE	Aprobado						No Asignado, Rodrigo Delay - No Apto para, 1	1	No Asignado
TRASLADO DE PLATAFO	Aprobado	Mecanicos - Carga_en_movimient	Mecanicos - Atrapado_¿			Trabajos en Alturas	Mario Dominguez - No Apto para Trabajos en Alturas, sola	2	Mario Domains
ASCENSO POR PLATAFO	Aprobado	Mecanicos - Carga_en_movimient	Mecanicos - Atrapado_¿			Supervision de seguridad	Rodrigo Delay- APTO para: Supervision de seguridad en AI	2	Rodrigo Delay
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								
Actividad adicional	Pendiente								

C.19 Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) con la información de la IPERC (paso 20).

C.20 "Aprobación Seguridad": "Ejecutada - Ok" y guardado (paso 21).
